ARGE Kellmünz

Bauzeitenplan zur Baumaßnahme Ausbau Ortsdurchfahrt und Illerbrücke Kellmünz

Nr.		Vorgang	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Ressourcennamen
1			Baustelle einrichten	1 Tag	Mon 18.03.19	Mon 18.03.19		Baustelle einricht
2			Fräsarbeiten BA2 + BA3	2 Tage	Die 19.03.19	Mit 20.03.19	1	Fräsarbeiten BA2
3			Straßenbau BA2	40 Tage	Don 21.03.19	Mon 20.05.19	2	Straßenbau BA2
4			Straßenbau BA3	60 Tage	Die 21.05.19	Mon 19.08.19	3	Straßenbau BA3
5			Straßenbau BA4	20 Tage	Die 20.08.19	Mon 16.09.19	4	Straßenbau BA4
6			Straßenabu BA1	20 Tage	Die 17.09.19	Die 15.10.19	5	Straßenabu BA1
7			Asphaltarbeiten Deckschicht	2 Tage	Mit 16.10.19	Don 17.10.19	6	Asphaltarbeiten D
8			Baustelle räumen	1 Tag	Fre 18.10.19	Fre 18.10.19	7	Baustelle räumen
9			Kanalbau BA3	30 Tage	Mon 03.06.19	Die 16.07.19		Kanalbau BA3
10			Feste Absperrung Gleis	1 Tag	Mon 15.04.19	Die 16.04.19	11AE	
11			Oberboden im Gleisbereich abziehen + Aufkiesen Weg/Standfläche Treppenanlage / Asphalt	2 Tage	Die 16.04.19	Don 18.04.19	12AE	
12			Aufbau Treppenanlage	3 Tage	Don 18.04.19	Don 25.04.19	13AE	
13			Erstellung prov. Entwässer	1 Tag	Don 25.04.19	Fre 26.04.19	14AE-2 Ta	
14			Abbruch Brücke	10 Tage	Die 30.04.19	Mit 15.05.19	15AE	
15			Aushub	3 Tage	Mit 15.05.19	Mon 20.05.19	16AE	
16			BE	2 Tage	Mon 20.05.19	Die 21.05.19		
17			Sauberkeitsschichten	1 Tag	Mit 22.05.19	Mit 22.05.19	16	
18			Fundament Widerlager	3 Tage	Don 23.05.19	Mon 27.05.19	17	
19			Fundament Pfeiler	3 Tage	Die 28.05.19	Fre 31.05.19	18	
20			Widerlager	15 Tage	Mon 03.06.19	Die 25.06.19	19	
21			Pfeiler	10 Tage	Mit 26.06.19	Die 09.07.19	20	
22			Pfeilersanierung	17 Tage	Die 18.06.19	Don 11.07.19	20EA-5 Ta	
23			Traggerüst	5 Tage	Fre 12.07.19	Fre 19.07.19	22	
24			Schalung Überbau	10 Tage	Mon 22.07.19	Fre 02.08.19	23	
25			Bewehrung Überbau	7 Tage	Mon 05.08.19	Die 13.08.19	24	
26			Betonage+ Nachbehandlur	3 Tage	Mit 14.08.19	Mon 19.08.19	25	
27			Üko	3 Tage	Die 20.08.19	Don 22.08.19	26	
28			Abdichtung	10 Tage	Fre 23.08.19	Don 05.09.19	27	
29			Kappen	10 Tage	Fre 06.09.19	Don 19.09.19	28	
30			Ausschalen	5 Tage	Fre 20.09.19	Don 26.09.19	29	
31			Baustelle räumen	3 Tage	Fre 27.09.19	Die 01.10.19	30	
32			Fertigstellung	0 Tage	Die 01.10.19	Die 01.10.19	31	

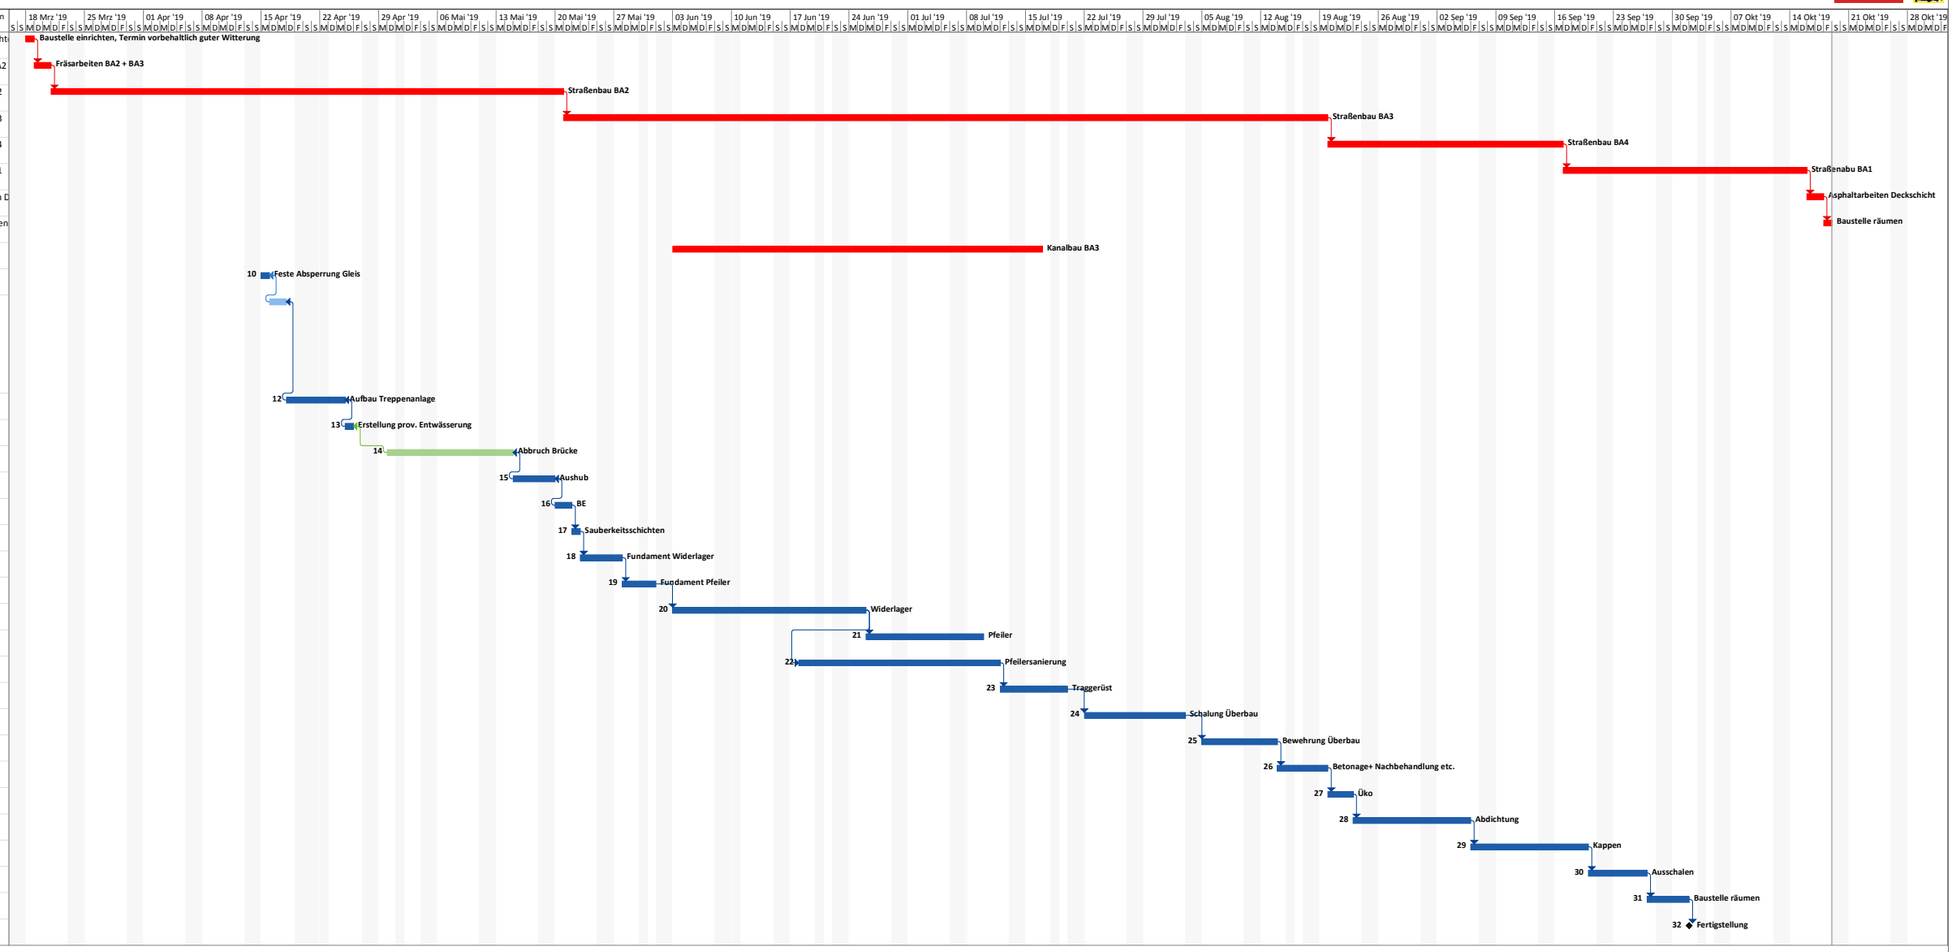

Projekt: Bauzeit Kellmünz Kutter
Datum: Mon 28.01.19

Vorgang | Unterbrechung | Meilenstein | Sammelvorgang | Projektsammelvorgang | Externe Vorgänge | Externer Meilenstein | Inaktiver Vorgang | Inaktiver Meilenstein | Inaktiver Sammelvorgang | Manueller Vorgang | Nur Dauer | Manueller Sammelrollup | Manueller Sammelvorgang | Nur Anfang | Nur Ende | Stichtag | In Arbeit | Manueller Fortschritt
